


Действия по проверке электромеханического подъёмника перед упаковкой и отгрузкой

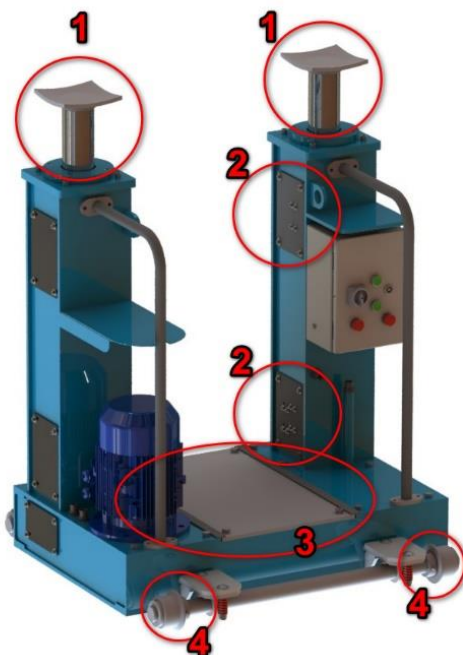

Примечания / что нужно исправить:

Перечень инструментов для проверки

Гайковёрт/трещотка

Головка под ключ на 19, под внутренний шестигранник на 5.

Рулетка, щуп 1.5мм

Смазка с пистолетом

Пломбы (наклеить после проверки электриком)

Лист замеров

Шаг, №	Действия	Отм.
1	Проверка внешнего вида всего подъёмника. Отсутствие грязи и царапин. Отсутствие окалины каплей от сварки. Проверить крепления колонн и электродвигателя. Сверить все параметры подъёмника с листом замеров (ширина подъёмника, тип колёс)	
2	Проверка комплектации. Наличие прикрепленной инструкции по первому запуску и паспорта (рук-во по эксплуатации прилагается в электронном виде, в бумажном виде по спец запросу). Наличие кабеля подключения к розетке. Наличие ключа для ящика от пульта управления.	
3	<u>Зона 1.</u> Проверка наличия в штоке под пятак защитной шайбы. Проверить сопряжение самого пятка в штоке.	
4	<u>Зона 2 (+ зеркально на другой колонне).</u> Открываем крышки и смотрим, убеждаемся в: наличии смазки на направляющих и на винте. Проверяем зазор между установочным винтом и поршнем щупом. Рукой проверить (не открутились ли) болты крепления страховочной гайки.	
5	<u>Зона 3.</u> Открыть центральную крышку. Убедиться в: - отсутствии грязи и других инородных предметов (инструмента, метизов и т.п.); - наличии прикрепленного спецключа; Проверить: - натяжку цепей (в том числе в бутерброде) и ремня, и их параллельность основанию подъёмника. При необходимости осуществить процесс натяжки; - крепление бутерброда к основанию; - наличие смазки на цепях; - длину пружины натяжения цепей редуктора, должна быть 50-60 мм.	
6	Проверить совместно с электриком электрическую часть подъёмника и после проверки поставить пломбу на пульт управления. (Прим.: номер пломбы должен быть занесен в паспорт подъёмника)	
7	Закрыть центральную крышку.	
8	Проверка работоспособности: включение и запуск подъёмника – подъём до верхних и опускание до нижних концевиков; убедиться в отсутствии посторонних шумов во время работы; убедиться, что нет краски и вмятин на штоках (когда они подняты). Обязательно проверить минимальную высоту подхвата и максимальную высоту подъёма. Сверить данные с листом замеров.	
9	<u>Зона 4 (+ с обратной стороны подъёмника).</u> Проверить ролики/колеса, убедиться в наличии смазки (если ролики). Убедиться, что ролики/колёса вращаются без заклинивания.	
